

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01, 02 Novostavba MŠ

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01,02 / 1

Číslo změny stavby:

29

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

1) Schéma HTU a JTV ZL.č.20; Schéma skutečně provedených JTV a sadových úprav

2a) Vyjádření AD

2b) Vyjádření TDS

3) Rekapitulace rozpočtů

4) Rozpočet MP

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Jedná se o upřesnění a konečné vyčíslení skutečně provedených prací v rámci JTV a sadových úprav v areálu MŠ SO01, parkoviště SO02 a ploch dotčených výstavbou MŠ.

Odůvodnění změny:

Tyto práce a dodávky, byly po dohodě s investorem a s uživatelem provedeny, s přihlédnutím na potřeby provozu školky a výstavby KD.

časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-342 366,55	-0,57%	191 350,00	0,32%	-151 016,55



Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<i>Petr Korymár</i>	datum	<i>15.7.2021</i>	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<i>Zbyněk Janda</i>	datum	<i>15.9.2021</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<i>Petr Michna</i>	datum	<i>15.9.2021</i>	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<i>Stanislav Kozlov</i>	datum	<i>15.9.2021</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

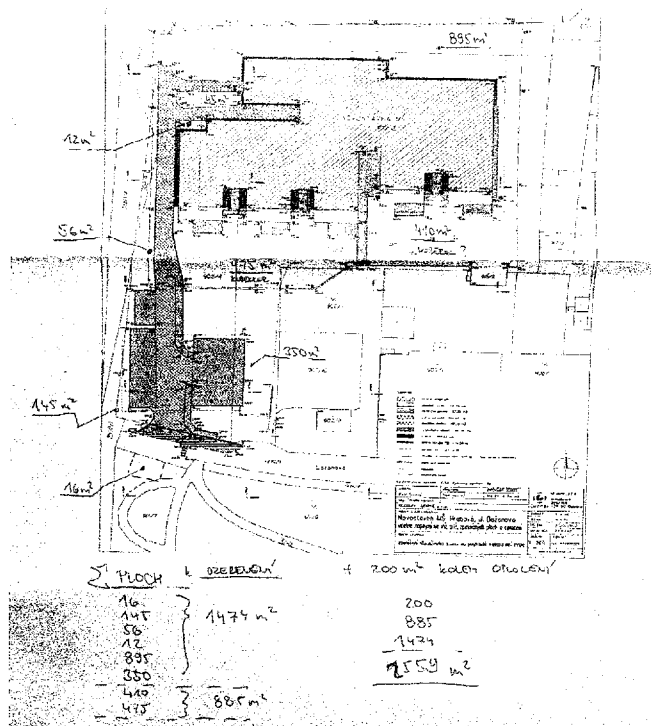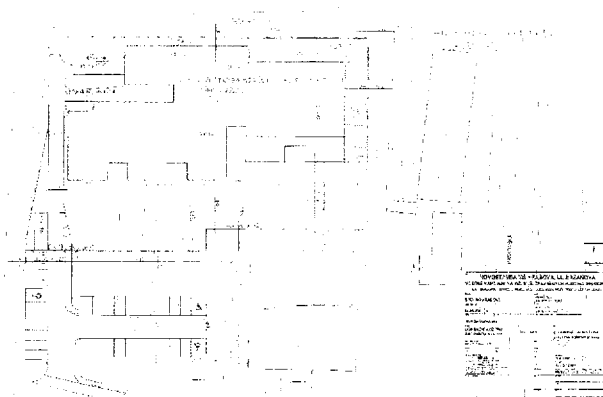

Vyjádření AD

EV LIST č. 29. SOONLATA
ING. AŽCH. POMPA



Vyjádření TDS

MP - zaměřen / po provedení pře-
VT - domluveno s objednatel

TDS doplněno



15.9.2021

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel : Monys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

Za objednatele :

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

Projektant:.....

 TDI:..... |

Datum:

Datum:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - MP

Stavba:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Stav:

2019 - 2021

Objekt:

HTU a JSTU

Objekt:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Stavba:

Novostavba

Stavba:

Morys s.r.o.

Novostavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena vá soust ava
Náklady soupisu celkem							-342 366,55	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-342 366,55	
D	1		Zemní práce				-342 366,55	
1	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-50,000	59,14	-2 957,00	SOD
	JTU podomnice		nákladka na kopci na tatrovku					
	kopec		I. Etapa (9+14)*7 - 29.31.3.2021		161,000			
			II. Etapa					
			Přední část zahrady - 600*0,15		75,000			
			Parkoviště SO02 (350+350)*0,2		105,000			
2	K	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-50,000	111,00	-5 550,00	SOD
	JTU podomnice		Preprava z kopce na stavbu					
	podomnice				-50,000			
1	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-50,000	59,14	-2 957,00	SOD
	JTU podomnice		nákladka na stavbě na nakladač					
	podomnice				-50,000			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-50,000	39,50	-1 975,00	SOD
	JTU podomnice		Přeprava po stavbě					
	podomnice				-50,000			
5	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných do násypů zhutněných	m3	-50,000	157,00	-7 850,00	SOD
	JTU podomnice		zásyp a rozprostření					
	podomnice				-50,000			
6	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	-50,000	14,78	-739,00	SOD
	JTU podomnice		modulace terénu					
	podomnice				-50,000			
103	K	103715002	substrát pro trávníky VL	m3	-175,500	1 050,00	-184 275,00	SOD
	Ornice - substrát		Areál MŠ 1530		1 530,000			
			Rozšíření areálu MŠ 430+70		500,000			
			SO02 350		350,000			
			koloběžkové hřiště 350		350,000			
			trasa přípojek 300		300,000			
					3 030,000			
			mocnost 0,1m		0,100			
					303,000			
			SKUTEČNOST					
			plocha 2550m2		2 550,000			
			mocnost 0,05m		0,050			
					127,500			
			ROZDÍL		-175,500			

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - VCP

Objekt: MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

Objekt:

Objekt:

HTU a JSTU

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Morys s.r.o.

Objekt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				191 350,00	
D	1		Zemní práce				191 350,00	
1.	103	10371500	Travní koberec - dodávka	m3	890,000	215,00	191 350,00	cena kalkulovaná

Ornice - substrát Areál MŠ 890

890,000
